

# 109年度水患自主防災社區現地訪評簡報



## 東門溪流域整治計畫





# 工程緣起

#### 面臨問題

- 東門溪流域於0611豪雨時,降雨強度逾200 年重現期,淹水深度超過1公尺,淹水面積約 200公頃。
- 本府持續推動流域整治計畫,東門溪龜山工 業區段及大灣溝、西坡渠目前未達區排保護 標準。

#### 後續大灣溝治理對策

- 大灣溝治理計畫拓寬河道。
- 上游設置滯洪池。
- 目前施作中工程

**樹仁三街滯洪池** 

大湳滯洪池

本工程 - 一期臨時池 二期永久池








### 樹仁三街滯洪池

- 一期工程內容:
  - A、B池滯洪量體共約2.9萬M3。
- 工程經費:
  - 一期滯洪池工程費(含變更設計)計
  - 3,416萬元。
- 工程期程:
  - A、B池於107年8月完工。



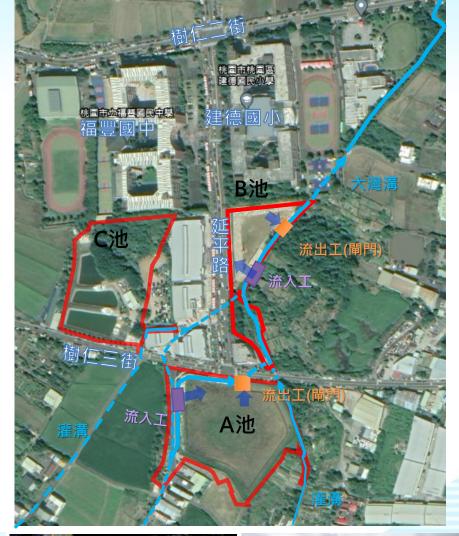



A池一期






# 樹仁三街滯洪池

#### ● 二期工程內容:

- ▶ 工程面積:3.44公頃。
- ▶ 建置滯洪池3座:滯洪量11.8萬立方 公尺、削減洪峰流量10.6cms。
- ▶ B池管控中心(含抽水設備):1棟。
- ▶ 簡易綠美化工程:2.87公頃。
- 工程經費:4.4億。
  - 滯洪池工程4億(營建署補助2.8億、 市自籌1.2億)
  - ▶ 景觀工程0.4億(市自籌)
- 工程期程:109年3月開工、111年11 月完工。



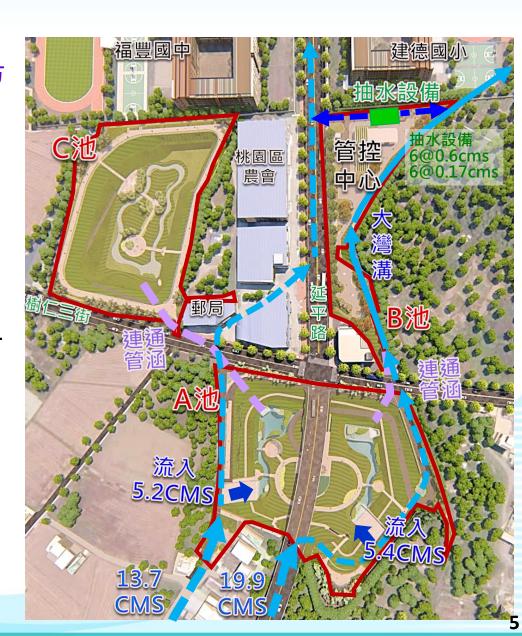

二期


滯洪池施工中防迅

#### ● 防汛內容:

A池:維持滯洪功能。 降挖至永久池池底(E.L. 98m), 滯洪量約4.7萬方,大於原一期滯 洪量2.9萬方。

#### 滞洪後復原: 以抽排方式抽水。自集水坑抽至 既有A池排既有水路。



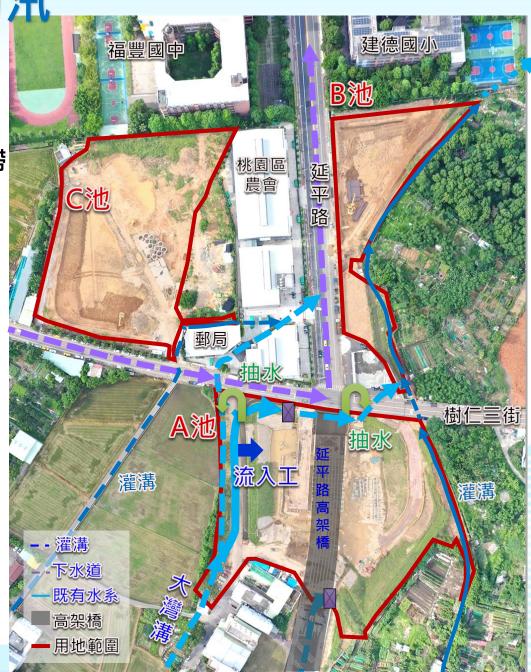

# 完工模擬圖

A 池 滯洪量5.32 萬立方公尺



# **C** 池 滞洪量3.82 萬立方公尺




- B 池 滞洪量2.66 萬立方公尺
- ✓ 綠覆管控中心外觀,延伸綠帶空間。
- ✓ 地下式滯洪池功能,提供觀摩教育。
- ✓ 池頂鋪面植栽美化, 融合周邊地景。







地下室滯洪池結構











# 簡報完畢恭請裁示
